



# ◆工事の進捗状況

3月13日時点

A棟では、建物の基礎となる床や柱の骨組みを作る鉄筋工と、コンクリート工事を引き続き行っています。

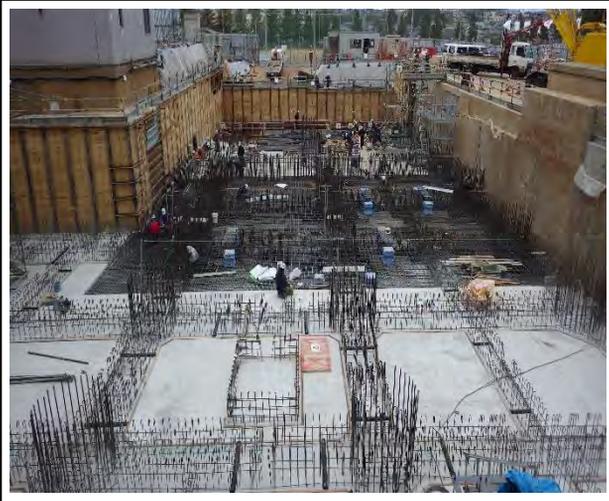

C棟では、地下部分のコンクリート工事を引き続き行っています。

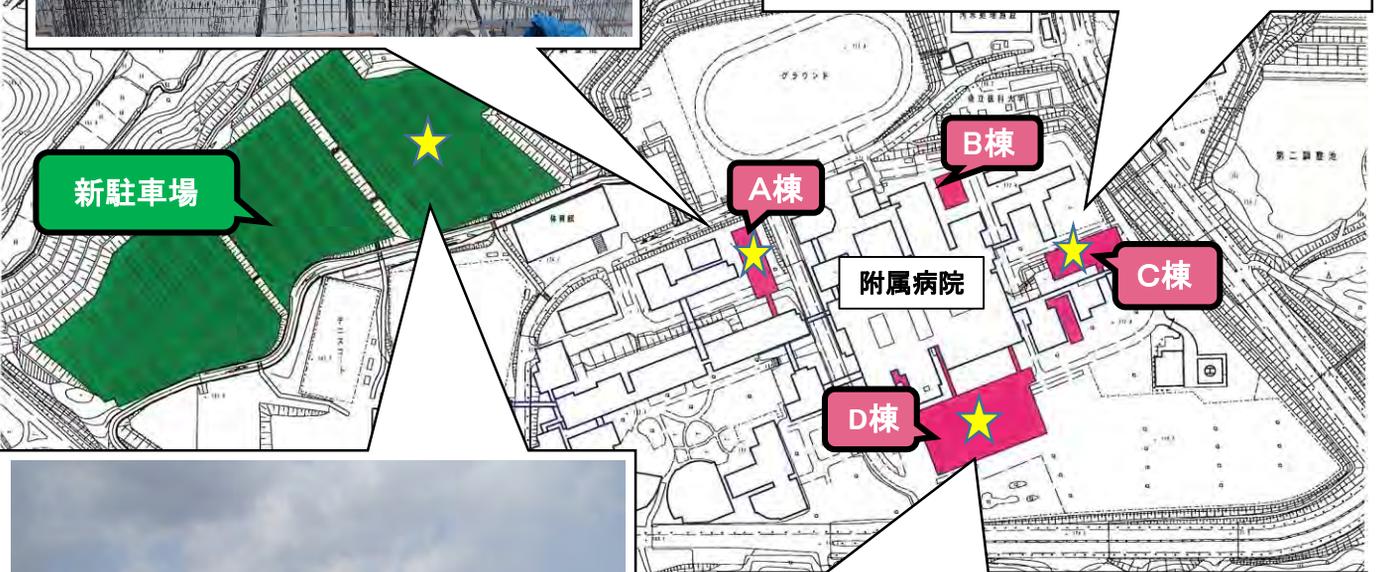

新駐車場では、三段のうち、体育館裏の一番下の段の造成が完了いたしました。



D棟では、建物の基礎を作るため、土砂を掘り出す掘削工と、掘削が完了したところから鉄筋工、コンクリート工を進めています。
