


# ◆工事の進捗状況

6月12日時点

A棟では、地下部分の梁や柱となる鉄骨工事を  
を行い、床や壁を作るための鉄筋工事、型枠  
工事を引き続き行っています。



C棟では、1階、2階部分の床・壁・柱を作る  
ための鉄筋工事、型枠工事を引き続き行っ  
ています。

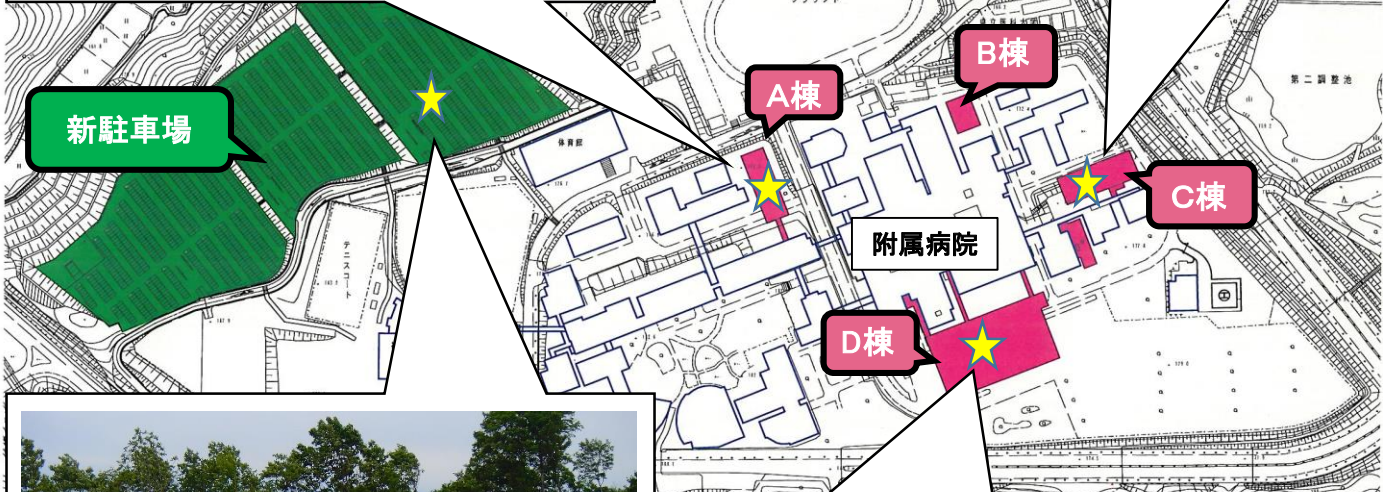

新駐車場では、下段の造成が完了したため、  
砕石を敷いて舗装の準備をしています。



D棟では、建物の基礎部分を作るための  
鉄筋・型枠工事と、免震装置を設置する  
免震工事を行っています。
