


A棟では、杭工事が終了しました。
続いて、建物の基礎部分を作るため、敷地の地盤を掘る土工事をしています。

B棟では、建物の基礎となる床や柱に
コンクリートを流し込むため、枠を作る
「型枠工事」を行っています。

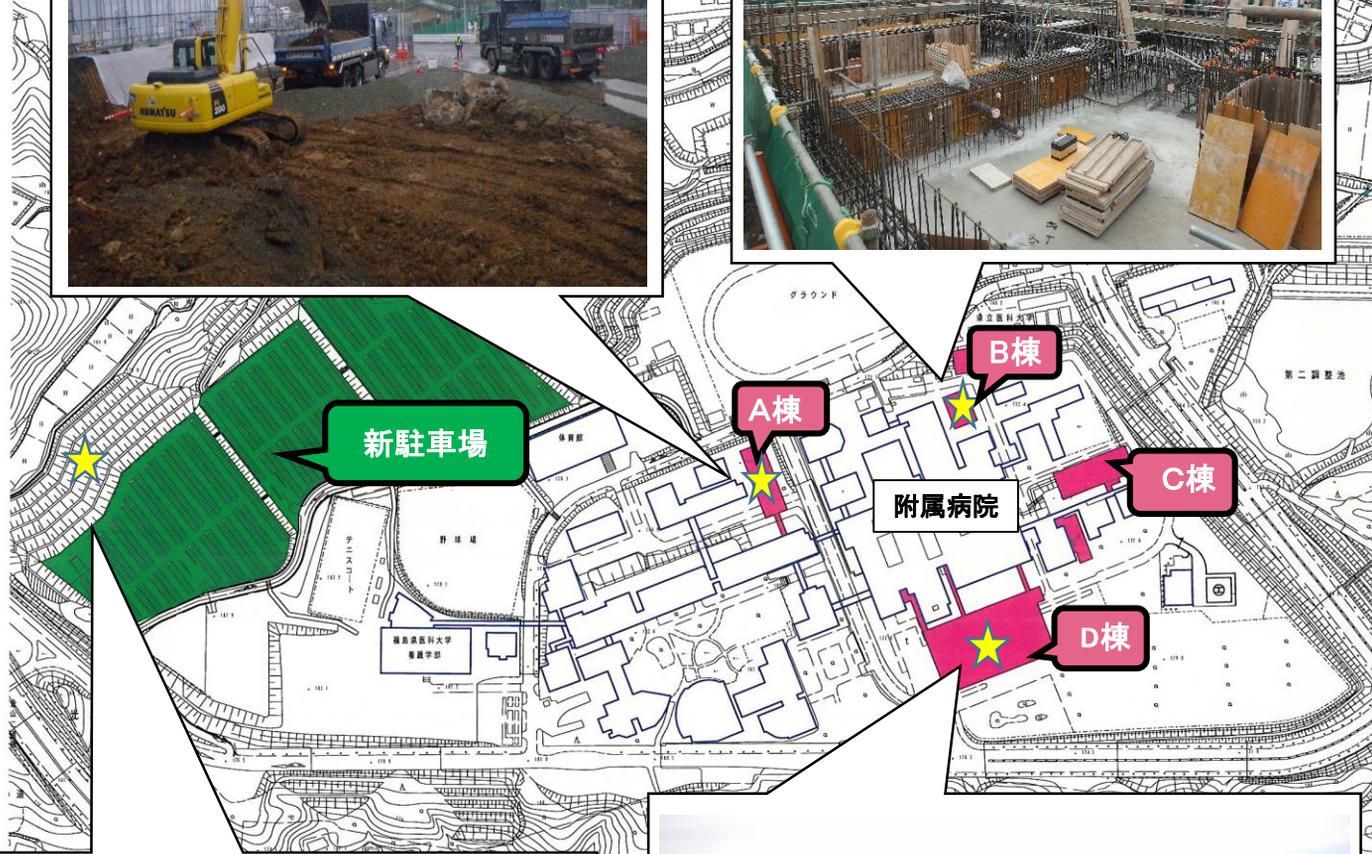

新駐車場では、盛土が崩れないよう、
のり面に格子枠を設置しています。

D棟では、建物の基礎部分を作るために、
土砂を掘り出す掘削工事と、掘削した部分
の地盤崩壊を防ぐ山留工事を行っています。
